Entrega 3 - Cronograma SGNP

Caso: Aplicativo en linea para la SGNP. Metodo usado: CPM.

Nota personal: resolvi el cronograma con red actividad-nodo porque asi me queda mas claro revisar secuencia, ruta critica y holguras.

Resultados principales

Duracion del proyecto: 52 semanas.

Ruta critica: A-B-C-H-I-K-M-O-P-Q.

Calculo de ruta critica y holguras

Actividad	Predecesoras	Sucesoras	Duracion	ES	EF	LS	LF	Holgura	Critica
A	INICIO	B	1	0	1	0	1	0	Si
B	A	C, D, F, J	1	1	2	1	2	0	Si
C	B	H	20	2	22	2	22	0	Si
D	B	E	5	2	7	15	20	13	No
E	D	H	2	7	9	20	22	13	No
F	B	G	5	2	7	7	12	5	No
G	F	H	10	7	17	12	22	5	No
H	C, E, G	I	1	22	23	22	23	0	Si
I	H	K	5	23	28	23	28	0	Si
J	B	FIN	1	2	3	51	52	49	No
K	I	L, M, N	1	28	29	28	29	0	Si
L	K	P	2	29	31	34	36	5	No
M	K	O	2	29	31	29	31	0	Si
N	K	O	1	29	30	30	31	1	No
O	M, N	P	5	31	36	31	36	0	Si
P	L, O	Q	15	36	51	36	51	0	Si
Q	P	FIN	1	51	52	51	52	0	Si

Nota: para cumplir continuidad de red, la actividad A usa el hito ficticio INICIO como predecesor y la actividad Q usa el hito ficticio FIN como sucesor.

Criterio aplicado por mi: mantuve duraciones enteras (sin traslapes) para comparar facil el escenario normal contra el comprimido.

Anexo A. Diagrama de red del cronograma
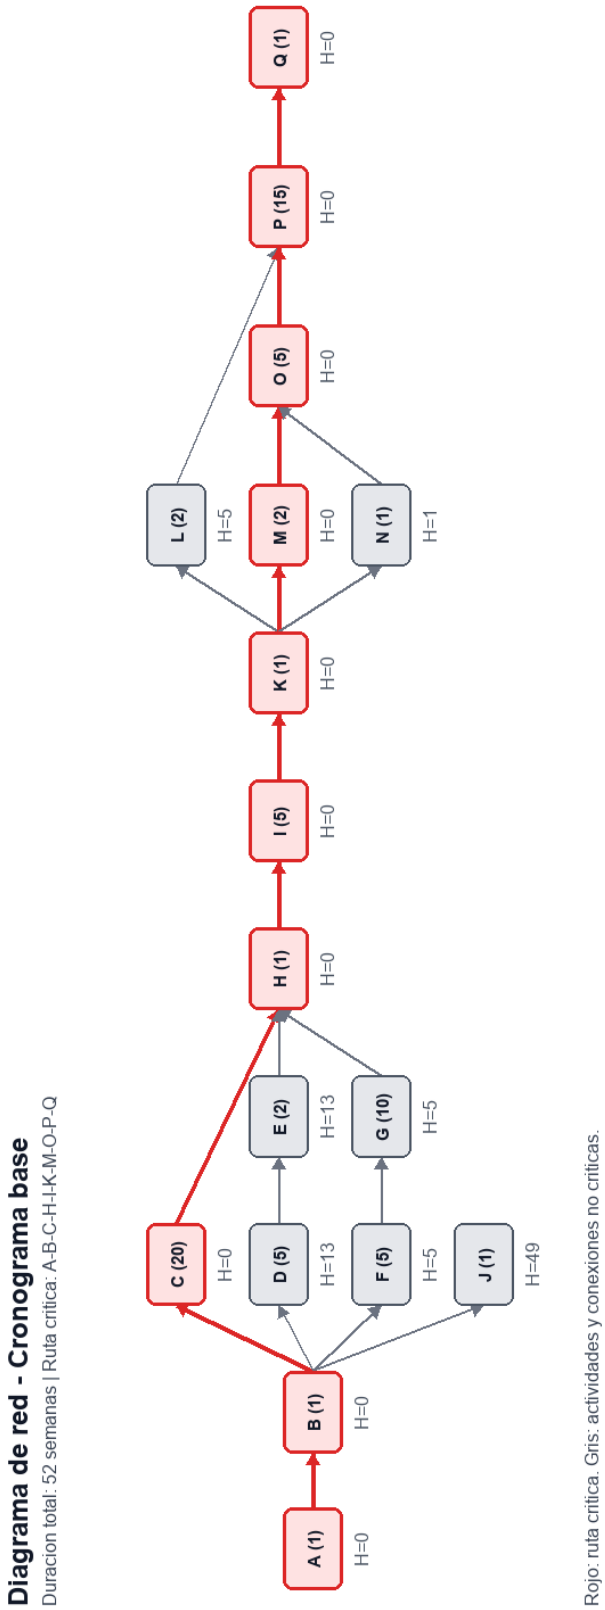
Se muestran actividades, conexiones de precedencia y ruta critica resaltada.
