Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

Proyecto: Aplicativo en línea para la SGNP. La EDT está orientada a entregables, usa sustantivos y permite verificar cuándo cada componente está completo.

EDT en formato árbol

El diagrama en árbol se presenta en el Anexo A al final del documento, en versión rotada para ajuste a hoja.

EDT en formato tabular

Código	Entregable	Descripción	Criterio de finalización
1.0	Aplicativo en línea para trámites notariales SGNP	Proyecto completo	Acta de cierre del proyecto aprobada por Tinterillos y SGNP.
1.1	Gerencia de proyectos	Gestión integral del proyecto	Plan, reportes, comités, control de cambios y cierre aprobados.
1.1.1	Planeación del proyecto	Plan de gestión, cronograma base, presupuesto base y matriz RACI.	Plan aprobado por patrocinador y equipo ejecutor.
1.1.2	Estimación y presupuesto	Estimación de esfuerzo, costos, reservas y línea base de costos.	Presupuesto base aprobado y trazable a entregables.
1.1.3	Seguimiento y reportes	Informes de avance, tablero de hitos, riesgos, costos y calidad.	Reportes periódicos entregados y revisados en comité.
1.1.4	Control de cambios	Registro, análisis de impacto y decisiones sobre cambios de alcance.	Solicitudes aprobadas, rechazadas o diferidas con soporte.
1.1.5	Cierre del proyecto	Acta de aceptación, lecciones aprendidas y transferencia operacional.	Aceptación formal y documentación de cierre firmada.
1.2	Diagnóstico y arquitectura	Evaluación técnica y diseño objetivo de la solución.	Arquitectura aprobada y brechas priorizadas.
1.2.1	Diagnóstico de infraestructura	Inventario de conectividad, servidores, ambientes, seguridad y protocolos.	Informe de diagnóstico validado por entidades participantes.
1.2.2	Dimensionamiento de demanda	Volumen de datos, transacciones, concurrencia y crecimiento esperado.	Modelo de capacidad aprobado con supuestos documentados.
1.2.3	Arquitectura de integración	Diseño de microservicios, integraciones y comunicaciones con entidades.	Documento de arquitectura aprobado por Turing y Tinterillos.
1.2.4	Diseño de seguridad	Controles de confidencialidad, integridad, autenticación y auditoría.	Controles trazados a riesgos y requisitos de identidad.
1.3	Funcionalidades notariales en línea	Módulos funcionales para compraventa de inmuebles.	Funcionalidades desarrolladas y probadas en ambiente de pruebas.
1.3.1	Citas virtuales	Programación y administración de citas entre partes y notaría.	Citas creadas, modificadas y consultadas correctamente.
1.3.2	Identificación biométrica	Validación facial, por voz y por huella de participantes.	Identidad validada con tres factores y registro de auditoría.
1.3.3	Gestión documental	Carga, consulta y control de escrituras electrónicas.	Escrituras disponibles, versionadas y protegidas.
1.3.4	Anotaciones documentales	Comentarios y observaciones	Anotaciones registradas y

		de participantes sobre documentos.	visibles para revisión notarial.
1.3.5	Flujos de trabajo	Automatización del proceso de compraventa de inmuebles.	Estados del trámite ejecutados según reglas definidas.
1.4	Plataforma tecnológica	Infraestructura, ambientes y operación técnica.	Ambientes listos para pruebas, piloto y producción.
1.4.1	Ambientes de desarrollo y pruebas	Configuración de ambientes, datos de prueba y despliegues.	Ambientes disponibles y documentados.
1.4.2	Escalabilidad y desempeño	Capacidad, balanceo, tiempos de respuesta y pruebas de carga.	Resultados dentro de umbrales aprobados.
1.4.3	Disponibilidad y continuidad	Monitoreo, respaldo, recuperación y contingencia.	Plan probado con evidencia de recuperación.
1.4.4	Integración con plataforma actual	Conexión con microservicios Spring Boot y servicios existentes.	Integraciones funcionando con pruebas end-to-end.
1.5	Calidad, pruebas y aceptación	Verificación funcional, técnica y de seguridad.	Evidencia de pruebas y aceptación del usuario.
1.5.1	Pruebas funcionales	Casos de prueba de citas, documentos, biometría y flujos.	Casos críticos ejecutados con defectos cerrados.
1.5.2	Pruebas de seguridad	Validación de acceso, identidad, auditoría e integridad documental.	Hallazgos críticos cerrados antes de producción.
1.5.3	Pruebas de desempeño	Carga, concurrencia y tiempos de respuesta.	Resultados cumplen criterios definidos.
1.5.4	Aceptación de usuarios	Validación con notarios, funcionarios y representantes de usuarios.	Acta de aceptación de piloto firmada.
1.6	Gestión del cambio y despliegue	Preparación organizacional y salida a producción.	Usuarios preparados y solución operando en notarías objetivo.
1.6.1	Capacitación	Materiales, sesiones y guías para notarios y funcionarios.	Usuarios clave capacitados y asistencia registrada.
1.6.2	Comunicaciones	Mensajes de adopción, instrucciones y canales de soporte.	Comunicaciones publicadas a públicos definidos.
1.6.3	Piloto controlado	Operación limitada en notarías seleccionadas.	Piloto evaluado con incidencias priorizadas.
1.6.4	Puesta en producción	Despliegue final y estabilización inicial.	Funcionalidades en operación antes del cierre del primer año.
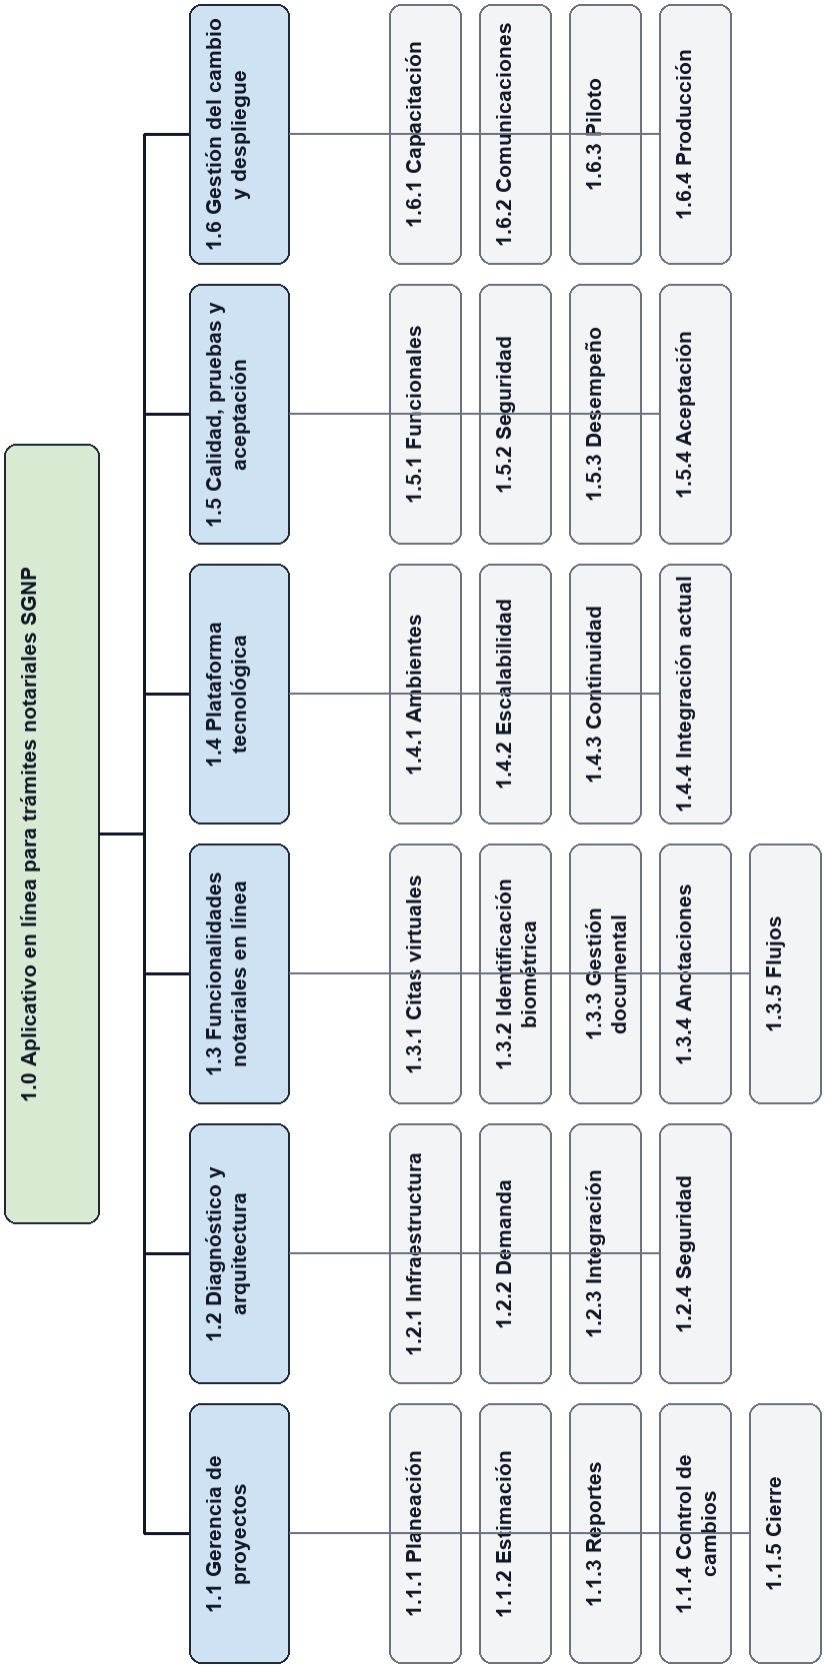
Anexo A. EDT en árbol (rotado 90°)
